




<p><i>Durée de la phase</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Démolition de l'îlot et mise en œuvre de grave bitume ▪ Démolition des trottoirs existants ▪ Réseau EP et réseau éclairage ▪ Pose de bordure ▪ Remblaiement ▪ Réglage des trottoirs ▪ Enrobés <p>5 jours</p>
<p>Secteur Nord Ouest du Carrefour</p> <p><i>Gestion circulation riverains</i></p> <p><i>Signalisation mise en place</i></p> <p><i>Travaux à réaliser</i></p> <p><i>Durée de la phase</i></p>	<p>Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automatique. Cette phase sera réalisé dans la continuité de la précédente afin de libérer le centre de la chaussée et pouvoir ensuite réaliser le coté Sud.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La zone de travaux sera fermée au public. Seuls les riverains pourront accéder à leur habitation. ▪ Afin de maintenir l'accessibilité des riverains, nous mettrons en place des plaques de franchissement lors des travaux de réseaux et bordures pour traverser la zone de chantier  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en place du balisage ▪ Démolition de l'îlot et mise en œuvre de grave bitume ▪ Démolition des trottoirs existants ▪ Réseau EP ▪ Pose de bordure ▪ Remblaiement ▪ Réglage des trottoirs ▪ Enrobés <p>3 jours</p>



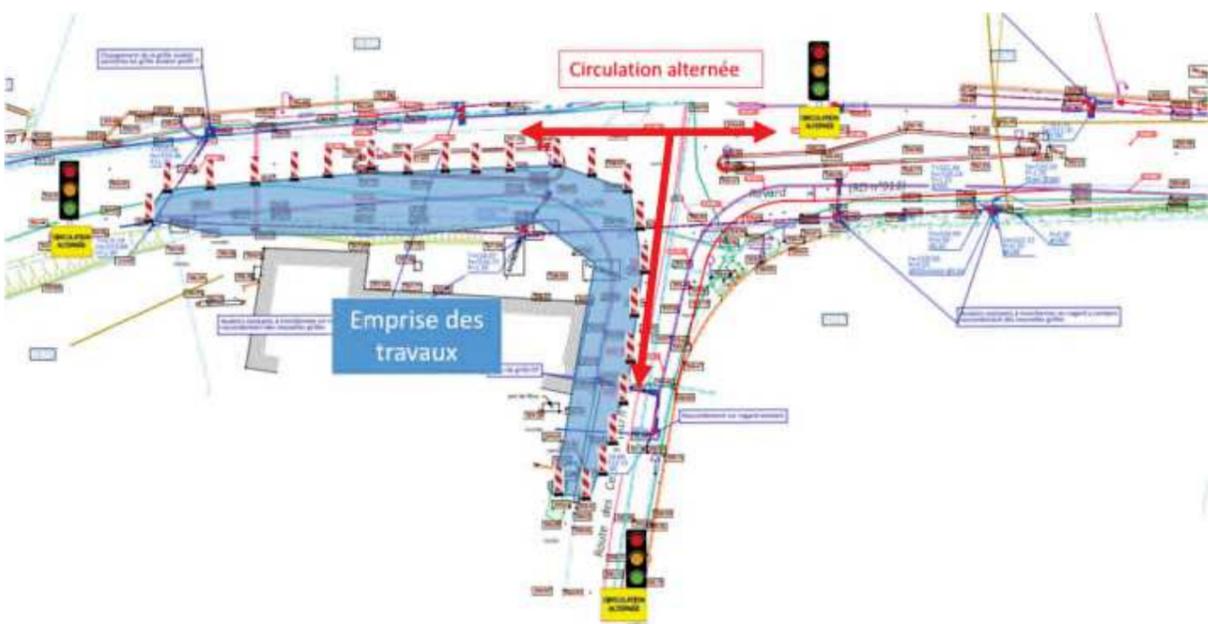


<p>Secteur Sud Ouest du Carrefour</p> <p><i>Gestion circulation riverains</i></p> <p><i>Signalisation mise en place</i></p> <p><i>Travaux à réaliser</i></p> <p><i>Durée de la phase</i></p>	<p>Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automatique. Nous commencerons par l'Ouest car nous viendrons de réaliser le côté opposé et que le réseau EP traversant la RD49 a son exutoire de coté là.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La zone de travaux sera fermée au public. Seuls les riverains pourront accéder à leur habitation. ▪ Afin de maintenir l'accessibilité des riverains, nous mettrons en place des plaques de franchissement lors des travaux de réseaux et bordures pour traverser la zone de chantier  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en place du balisage ▪ Démolition des bordures existantes ▪ Réseau EP ▪ Pose de bordure ▪ Remblaiement ▪ Réglage des trottoirs ▪ Enrobés <p>3 jours</p>
<p>Secteur Sud Est du Carrefour</p> <p><i>Gestion circulation riverains</i></p>	<p>Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automatique. En terminant par cette phase le carrefour, nous nous positionnons pour enchaîner avec le secteur Sud de la chicane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La zone de travaux sera fermée au public. Seuls les riverains pourront accéder à leur habitation. ▪ Afin de maintenir l'accessibilité des riverains, nous mettrons en place des plaques de franchissement lors des travaux de réseaux et bordures pour traverser la zone de chantier




<p><i>Signalisation mise en place</i></p>	
<p><i>Travaux à réaliser</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en place du balisage ▪ Démolition des bordures existantes ▪ Réseau EP ▪ Pose de bordure ▪ Remblaiement ▪ Réglage des trottoirs ▪ Enrobés
<p><i>Durée de la phase</i></p>	<p>4 jours</p>

<p>Élargissement coté Sud</p> <p><i>Gestion circulation riverains</i></p> <p><i>Signalisation mise en place</i></p>	<p>Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La zone de travaux sera fermée au public ▪ Aucun accès riverain ne se situe dans ce secteur
<p><i>Travaux à réaliser</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en place du balisage ▪ Démolition des bordures existantes ▪ Réseau EP ▪ Continuité de fossé ▪ Pose de bordure ▪ Remblaiement
<p><i>Durée de la phase</i></p>	<p>5 jours</p>

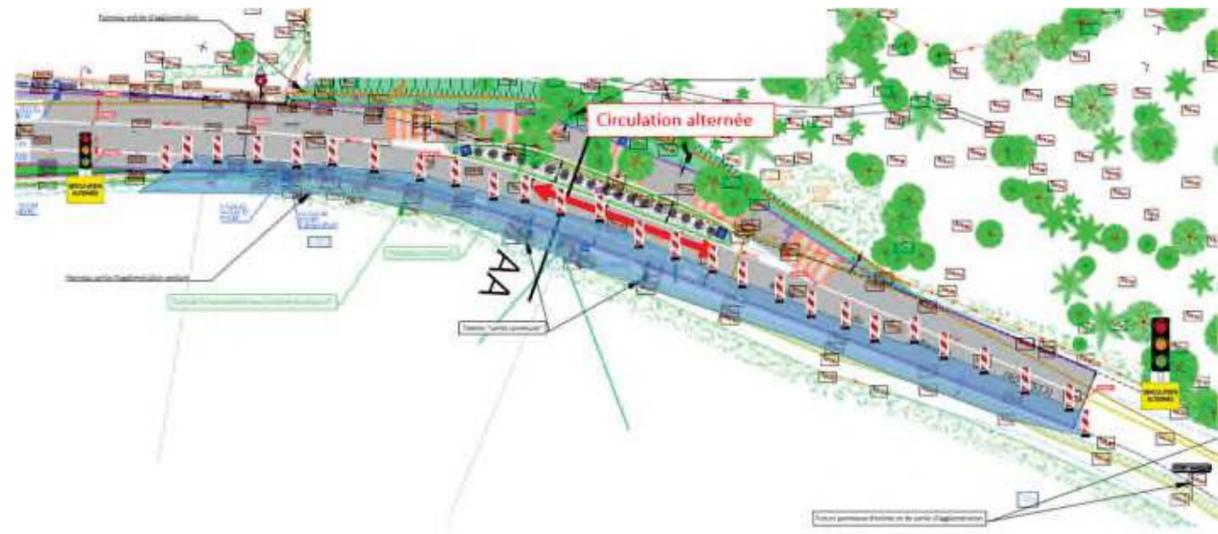

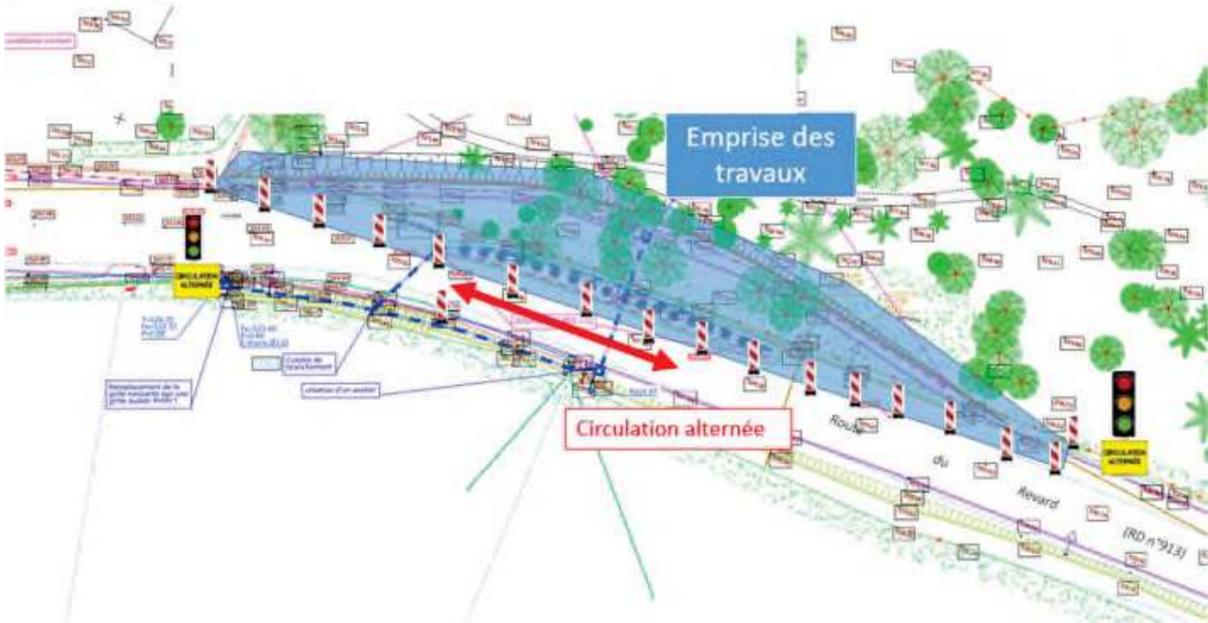

<p>Création de la chicane</p> <p><i>Gestion circulation riverains</i></p> <p><i>Signalisation mise en place</i></p>	<p>Pour la réalisation de cette phase, la circulation sera maintenue par alternat automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La zone de travaux sera fermée au public ▪ Aucun accès riverain ne se situe dans ce secteur
<p><i>Travaux à réaliser</i></p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mise en place du balisage ▪ Démolition des bordures existantes ▪ Réseau EP ▪ Continuité de fossé ▪ Pose de bordure ▪ Remblaiement
<p><i>Durée de la phase</i></p>	<p>6 jours</p>

<p>Voirie finale</p> <p><i>Couche de Grave bitume sur RD 913</i></p> <p><i>Tapis en BBSG 0/10</i></p> <p><i>Finitions</i></p>	<p>Une circulation alternée sera mise en place sur la RD 913 lors de la mise en place du finisseur et des moyens de compactage</p> <p>La passe initiale sera en grave bitume pour réaliser le renforcement sur l'élargissement dans la chicane de ralentissement</p> <p>Ensuite nous préparerons le plateau en grave bitume sous circulation alternée</p> <p>Nous commencerons par la chicane en alternat puis nous décalerons le finisseur pour réaliser le plateau ralentisseur également sous alternat. Le but étant de limiter la longueur de l'alternat.</p> <p>Les travaux de marquage, mise à la cote et finition d'espaces verts seront réalisé sous balisage léger et mobile. Le besoin d'engin et d'emprise étant très limité pour ces interventions ponctuelles.</p>
--	---
